

특수공시

1 | 논공읍출장소 공공복합청사 건립

2 | 매곡리 녹지 무장애나눔길 조성공사

3 | 유치곤장군 호국기념관 건립공사

4 | 화물자동차 공영차고지 조성사업

5 | 현풍 교통문화파크 조성사업

6 | 달성군청~옥포강림임대주택단지 간 도시계획도로 개설

7 | 옥포 송해공원~기세교차로 간 도시계획도로 개설

8 | 화원 설화성산 자연재해위험개선지구 정비사업

9 | 현풍읍 경관광장 조성사업

10 | 현풍 하수처리구역 오수관로 설치사업

11 | 달성 테크노 스포츠센터 건립

12 | 달성군민운동장 리모델링 사업

논공읍출장소 공공복합청사 건립

주관부서 : 회계과 청사관리팀(☎8372)

사업목적

노후한 논공읍 출장소의 안전성 문제 해결과 주민건강실 조성을 통한
군민복리증진을 위해 논공읍 출장소를 복합시설로 신축하여 다양한
공공서비스를 제공하고자 함.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 4. ~ 2024. 5.
- 위 치 : 논공읍 북리 1-130번지
- 사업규모 : 지하 1층 / 지상 3층 (1,425㎡)
- 용 도 : 논공읍 공단출장소, 예비군 논공읍대, 주민건강실 등
- 사 업 비 : 52.3억 원(군비)

□ 추진상황

- 2020. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2021. 4. : 건립계획 수립(기본구상)
- 2021. 6. ~ 9. : 기본계획 타당성 조사용역 시행
- 2021. 10. : 대구시 투자심사 승인, 중기지방재정계획 수정반영
- 2021. 11. : 공유재산심의회 승인
- 2021. 12. : 공유재산 관리계획 승인
- 2021. 12. ~ 2022. 2 : 공공건축사업계획 사전검토
- 2022. 3. : 공공건축심의위원회
- 2022. 5. : 조달청 설계공모
- 2022. 8. ~ 2023. 3. : 기본 및 실시설계 용역
- 2023. 3. : 일상감사 및 계약심사
- 2023. 4. ~ 2024. 5. : 착공 및 준공

■ 위치도 또는 현장사진



매곡리 녹지 무장애나눔길 조성공사

주관부서 : 공원녹지과 녹지팀(☎2851)

사업목적

어린이, 장애인 등 보행 약자를 위한 무장애나눔길 조성을 통하여 지역 주민에게 녹색휴식공간을 제공하고 녹지 이용률을 제고하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 다사읍 매곡리 1554 일원
- 사업규모 : 완충녹지 L=1.7km
- 기 간 : 2022. 1. ~ 11.
- 사업내용 : 산책로 포장 및 데크로드 설치, 편의시설 설치 등
- 소요예산 : 700백만 원(국 420,시 280)
 - 22년도 녹색자금 공모사업(한국산림복지진흥원)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022년	비 고
계	700	-	700	
국 비	420	-	420	
시 비	280	-	280	
군 비	-	-	-	

□ 추진상황(진도율 : 30%)

- 2021. 7. ~ 10. : 공모사업 신청, 선정
- 2022. 2. ~ 7. : 실시설계용역 및 일상감사, 시 계약심사 시행

□ 향후계획

- 2022. 7. ~ 11. : 공사 시행 및 준공

위치도



현장사진



유치곤장군 호국기념관 건립공사

주관부서: 복지정책과 복지기획팀(☎2514)

사업목적

유치곤장군 호국기념관의 노후화로 발생한 외부균열, 누수를 해결하고 국가와 민족을 위해 희생한 유치곤장군의 고귀한 정신을 후손에게 이어 나가고자 함.

□ 사업개요

- 사업기간: 2021. 9. ~ 2023. 8.
- 위 치: 유가읍 양리 287-1외 2필지, 유치곤장군 호국기념관
- 사업규모: 지상 2층(연면적 301㎡)
- 사 업 비: 1,193백만 원(군비)

□ 추진현황 및 향후계획

- 2021. 9. : 건립 기본계획 수립,
- 2021.10. ~ 12. : 공유재산관리계획 승인
- 2022. 1. : 공공건축심의, 일상감사 및 계약심사
- 2022. 2. ~ 9. : 기본 및 실시설계
- 2022. 9. ~ 10. : BF(장애물 없는 생활환경) 인증,
건축 협의(건축, 전기, 소방, 기계 등)
- 2023.11. ~ 2023. 8.: 착공 및 준공

□ 기대효과

- 6.25전쟁 시 공군사에 유일한 203회 출격기록을 세운 호국인물인 빨간마후라 유치곤장군 호국기념관 재건립으로 군민의 자긍심 고취 및 호국정신 계승발전과 더불어 비슬산 관광명소화에 기여
- 국가보훈대상자와 그 유가족의 복지증진을 위한 보훈시설의 설치 및 운영으로 국가를 위하여 희생하거나 공헌한 분들의 숭고한 정신을 후손들이 기억하고, 이를 정신적 토대로 삼아 국민통합과 국가발전에 기여토록 하는 국가보훈의 기본이념을 달성

■ 위치 도



■ 조감 도



화물자동차 공영차고지 조성사업

주관부서 : 교통과 교통시설팀(☎3811~3)

사업목적

화물자동차 차고지 외 불법주차로 인한 안전사고 예방 및 주민 불편 해소와 운전자를 위한 편의시설을 제공함으로써 원활한 수송여건 조성과 안전운행을 도모하여 물류비용 절감과 창조경제 활성화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016. 9. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 화원읍 설화리 809, 간경리 253번지 일원
- 사업규모 : 주차대수 612면(대형 419, 소형 176, 트레일러 17 / A=79,574㎡)
- 사 업 비 : 490억 원(국비 9.5억 원, 시비 407억 원, 군비 73.5억 원)

□ 추진상황(진도율 : 60%)

- 2016. 9. : 기본구상 및 타당성 용역완료(대구경북연구원)
- 2018. 2. : 화물자동차 공영차고지 기본계획 완료
- 2017. 5. : 개발제한구역관리계획 및 도시관리계획시설결정 용역 착수
- 2019. 9. : 중앙도시계획위원회 심의(조건부 수용 의결)
- 2019. 11. : 개발제한구역관리계획 변경 승인(국토교통부)
- 2020. 5. : 기본 및 실시설계 착수
- 2020. 5. : 지방도시계획위원회(도시계획시설결정) 심의 결정
- 2021. 7. : 실시계획 고시 및 보상계획 열람공고
- 2022. 6. : 제4차 지방토지수용위원회 개최
- 2022. 8. : 제4차 재결보상금 지급 및 공탁

□ 향후계획

- 2022. 12. : 제5~6차 재결보상금 지급 및 공탁
- 2023. 1. : 문화재 시굴조사 용역 일상감사 및 계약심사
 - ※ 조사결과에 따라 정밀발굴조사용역(표본조사→시굴조사→정밀발굴조사)으로 이어질 수 있음.
- 2023. 7. : 착공 예정
- 2024. 12. : 준공 예정(18개월)

■ 위치도 또는 현장사진



■ 조감도



현풍 교통문화파크 조성사업

주관부서 : 교통과 교통시설팀(☎3813)

사업목적

늘어나는 정주인구로 인한 주차 공간 부족과 주민들의 휴식 공간 수요를 해소하기 위해 공영주차장, 주민편의시설 및 체육시설 등이 포함된 공원 시설을 조성하여 주거환경 개선 및 주민 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 8. ~ 2023. 4.
- 위 치 : 현풍읍 성하리 459번지 일원
- 사업규모 : 간이시외버스터미널, 공영주차장, 잔디광장 조성 등(A=26,898㎡)
- 사 업 비 : 140.5억 원(시비 6억 원, 군비 134.5억 원)

□ 추진상황(진도율 : 70%)

- 2018. 8. : 기본계획 구상 및 타당성 조사 용역
- 2019. 9. : 하동(하리)공원조성계획결정(변경) 및 지형도면 고시
- 2020. 3. : 현풍 교통문화파크 조성사업 실시계획 용역 착수
- 2020. 6. : 사업인정 고시(실시계획 인가)
- 2020. 9. : 보상물건 공부대조 및 보상계획 열람공고
- 2021. 3. : 대구시 도시공원위원회 심의 및 공원조성계획결정 변경
- 2022. 1. : 설계용역 완료 및 토목공사 착공
- 2022. 2. : 지장물 이설협의(한전주, 통신주, 가로등 보안등 등)
- 2022. 4. : 지정폐기물(폐석면) 철거공사 및 용역 완료 및 전기공사 착공
- 2022. 5. : 통신공사 착공
- 2022. 7. : 건축공사 착공

■ 향후계획

- 2023. 4. : 준공 예정

■ 위치도 또는 현장사진



■ 조감도



달성군청~옥포강림임대주택단지 간 도시계획도로 개설

주관부서 : 건설과 도로시설2팀(☎3751)

사업목적

지역주민들의 교통 불편을 해소하기 위해 달성군청과 옥포 강림리를 연결하는 도로를 개설하여 지역주민 민원 해소 및 지역균형개발 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 달성군청 ~ 옥포강림임대주택단지 간
- 규 모 : B=30m, L=603m(1공구 L=230m 완료, 2공구 L=373m 추진중)
- 사업기간 : 2010. 1. ~ 2022. 10.
- 총사업비 : 161.5억 원(설계 2, 보상 110, 공사 46.5, 건설사업관리 3)
(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022년	2023년 이후	비 고
계	16,150	13,900	2,250	-	
국 비	-	-	-	-	
시 비	7,600	6,300	1,300	-	
군 비	8,550	7,600	950	-	

□ 추진상황(공정률 : 74%)

- 2010. 5. : 실시설계용역 완료
- 2015. 8. : 대구시 재정투자사업 조건부 승인
- 2018. 11. : 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2019. 2. : 보상계획 열람공고
- 2019. 7. : 보상 협의
- 2020. 12. : 1공구(L=230m) 준공
- 2021. 4. : 2공구(L=373m) 착공
- 2022. 8. : 우수관로 부설 및 L형측구 시공

□ 향후계획

- 2022. 10. : 공사 준공

■ 위치도



옥포 송해공원 ~ 기세교차로 간 도시계획도로 개설

주관부서 : 건설과 도로시설2팀(☎3751)

사업목적

달성1차산업단지 방향 진입도로 상습 교통체증 해소를 통한 산업단지 활성화와 송해공원 이용객의 교통편의 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 옥포읍 기세리 일원
 - 규 모 : B=24.7m, L=1,140m
 - 사업기간 : 2017. 8. ~ 2022. 7.
 - 총사업비 : 171.5억 원(설계 2, 보상 101, 공사 64.5, 건설사업관리 4)
- (단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022년	2023년 이후	비 고
계	17,150	14,995	2,155	-	
국 비	-	-	-	-	
시 비	6,300	4,895	1,405	-	
군 비	10,850	10,100	750	-	

□ 추진상황(공정률 : 100%)

- 2018. 7. : 실시설계용역 완료
- 2018. 8. : 실시계획 고시
- 2018. 11. : 보상계획 열람공고
- 2019. 3. : 손실보상금 결정 통보
- 2020. 7. : 공사 착공
- 2020. 12. : 건설사업관리 용역 착수
- 2022. 6. : 암거박스, 경계석 등 구조물 시공
- 2022. 7. : 공사 준공

■ 위치도



■ 준공등 현장사진



화원 설화·성산 자연재해위험개선지구 정비사업

주관부서: 안전방재과 자연재난팀(☎2991)

사업목적

“화원 설화·성산지구 자연재해위험개선지구 정비사업”을 통해 화원읍 일원의 시가지 및 농경지의 재해위험요인을 해소하여 주민 안전 확보 및 재산 보호에 기여하고자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 달성군 화원읍 설화리, 성산리 일원
- 규 모
 - 소화천 정비: 강변저류지 신설 1개소($V=32,000\text{m}^3$)
 - 펌프장 증설: 2개소(성산1: $Q=42\rightarrow 270\text{m}^3/\text{min}$, 성산2: $Q=42\rightarrow 156\text{m}^3/\text{min}$)
 - 하수관거 정비 $L=5,822\text{m}$, 세천정비 $L=380\text{m}$, 사방댐 2개소, 홍수예경보시설 1식 등
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.
- 총사업비 : 42,120백만 원(국비 21,060, 지방비 21,060)
'22년도 2,110백만 원(국비 1,055, 지방비 1,055)

□ 추진상황(총진도 : 10%)

- 2021. 4. : 행정안전부 신규사업 공모
- 2021. 12. : 자연재해위험지구 지정(달성군 고시 제2021-307호)
- 2021. 12. : '22년 재해위험지역정비 정부 예산 및 사업계획 확정
- 2022. 1. : 용역발주 사전심의 실시
- 2022. 2. : 일상감사 및 계약심사 실시
- 2022. 3. : 계약심의위원회 심의 실시
- 2022. 4. : 사업수행능력평가서 제출 안내 공고 및 평가 실시
- 2022. 6. : 기본 및 실시설계용역 착수

□ 향후계획

- 2023. 6. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2023. 7. : 공사 착공 및 편입 토지 보상
- 2025. 12. : 공사 준공

■ 위치도(정비종합계획도)



■ 착공 전 현장사진



현풍읍 경관광장 조성사업

공사부서 : 안전방재과 하천관리팀(☎2982)

주관부서 : 도시과 도시계획팀(☎2811)

사업목적

현풍읍 성하리 398-2번지 일대 경관광장 조성으로 지역미관을 개선하고 주민들의 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

- 위치 : 현풍읍 성하리 398-2번지 일원(달성군민체육센터 앞)
- 규모 : 경관광장 조성 A=19,640㎡(벽천 1개소, 바닥분수 1개소, 전망대 1개소, 데크로드 L= 330m 등)
- 사업기간 : 2020. 4. ~ 2023. 7.
- 사업비 : 23,781백만 원(군비)

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기 투자	2021	2022 이후	비고
계	23,781	470	12,200	11,111	
군비	23,781	470	12,200	11,111	

※ 설계 470백만 원/ 보상 16,000백만 원/ 공사 7,000백만 원/기타 311백만 원


□ 추진상황(진행현황 : 보상99%, 공사5%)

- 2020. 4. 10. : 실시설계용역 착수(안전방재과)
- 2021. 2. 10. : 실시설계 작성 고시
- 2021. 2. 19. ~ 3. 18. : 보상열람공고(도시과)
- 2021. 5. 3. : 감정평가 실시
- 2021. 6. 21. ~ 7. 8. : 실시계획 작성 변경에 따른 주민열람 공고
- 2021. 7. 23. ~11. 5. : 보상협의
- 2022. 1. 1. : 실시설계용역 완료(안전방재과)
- 2022. 3. 21. : 공사착공

□ 향후계획

- 2023. 7. : 공사 준공 예정

■ 위치도

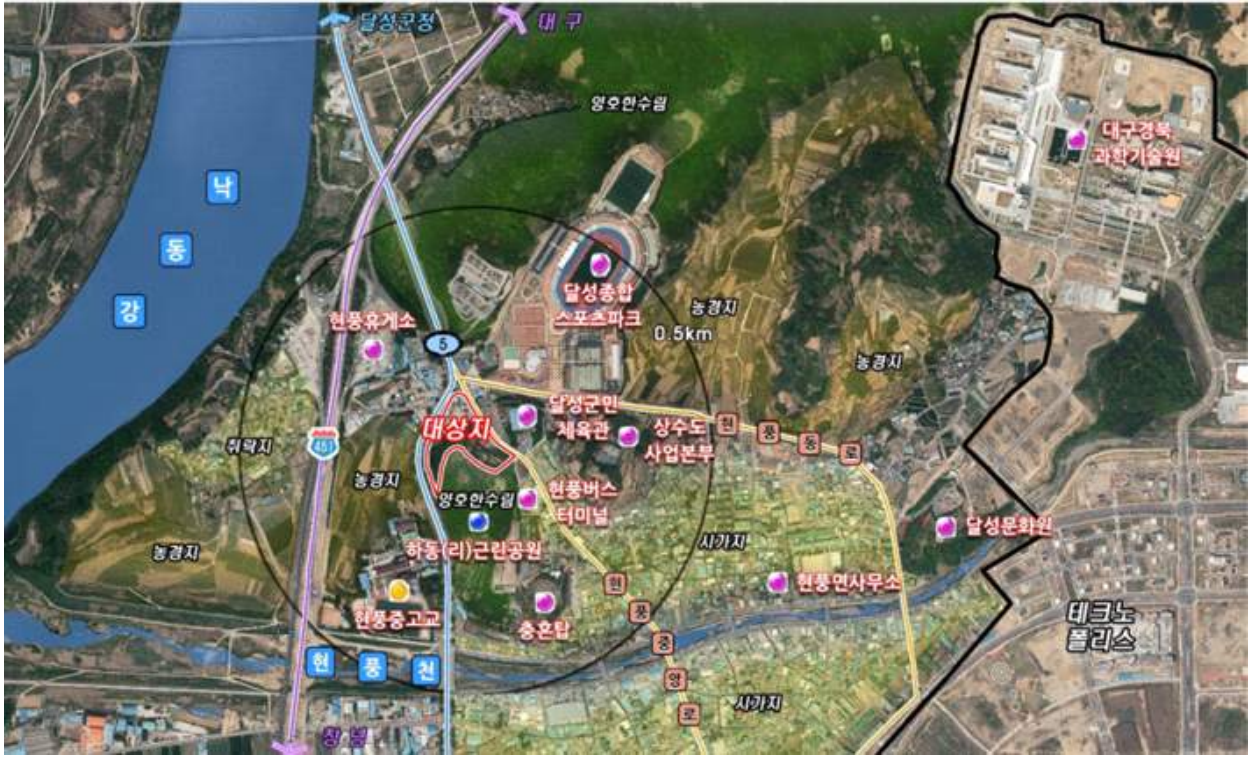

■ 조감도



현풍 하수처리구역 오수관로 설치사업

주관부서 : 도시정비과 하수시설팀(☎2961)

사업목적

현풍, 유가, 구지면 지역 우·오수 분리사업을 시행하여 생활하수를 원활히 처리하여 하수처리장의 처리효율을 극대화하고 낙동강 수질개선과 지역 주민의 쾌적한 생활환경개선에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 현풍읍, 유가읍, 구지면 미분류 지역
- 규 모 : 오수관로 L=40Km, 맨홀펌프장 10개소, 배수설비 1,599가구
- 사업기간 : 2020. 2. ~ 2023. 11.
- 총사업비 : 30,933백만 원(국 21,653 / 시 9,280)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기 투자	2022년	2023년 이후	비 고
계	30,933	12,780	2,733	15,420	
국 비	21,653	1,585	2,550	17,518	
시 비	9,280	11,195	183	-2,098	
균 비 등	-	-	-	-	


□ 추진상황(공정률 : 54%)

- 2009. 6. : 대구광역시 하수도 기본계획 반영
- 2014. 8. : 실시설계용역 착수
- 2015. 7. ~ 11. : 하수도 기술자문, 경제성검토(VE) 및 건설기술심의(대구시)
- 2016. 4. : 재원조달 협의 완료(환경부)
- 2016. 6. : 실시설계용역 완료
- 2019. 5. : 총사업비 변경 완료(환경청)
- 2019. 6. ~ 8. : 용역발주심의 및 건설기술심의, 계약심사완료(대구시)
- 2020. 2. : 감리 착수 및 공사 착공
- 2022. 8. : 지2리 외 23개리 오수관로 33.5km 시공중

□ 향후계획

- 2023. 11. : 공사 준공

위치도

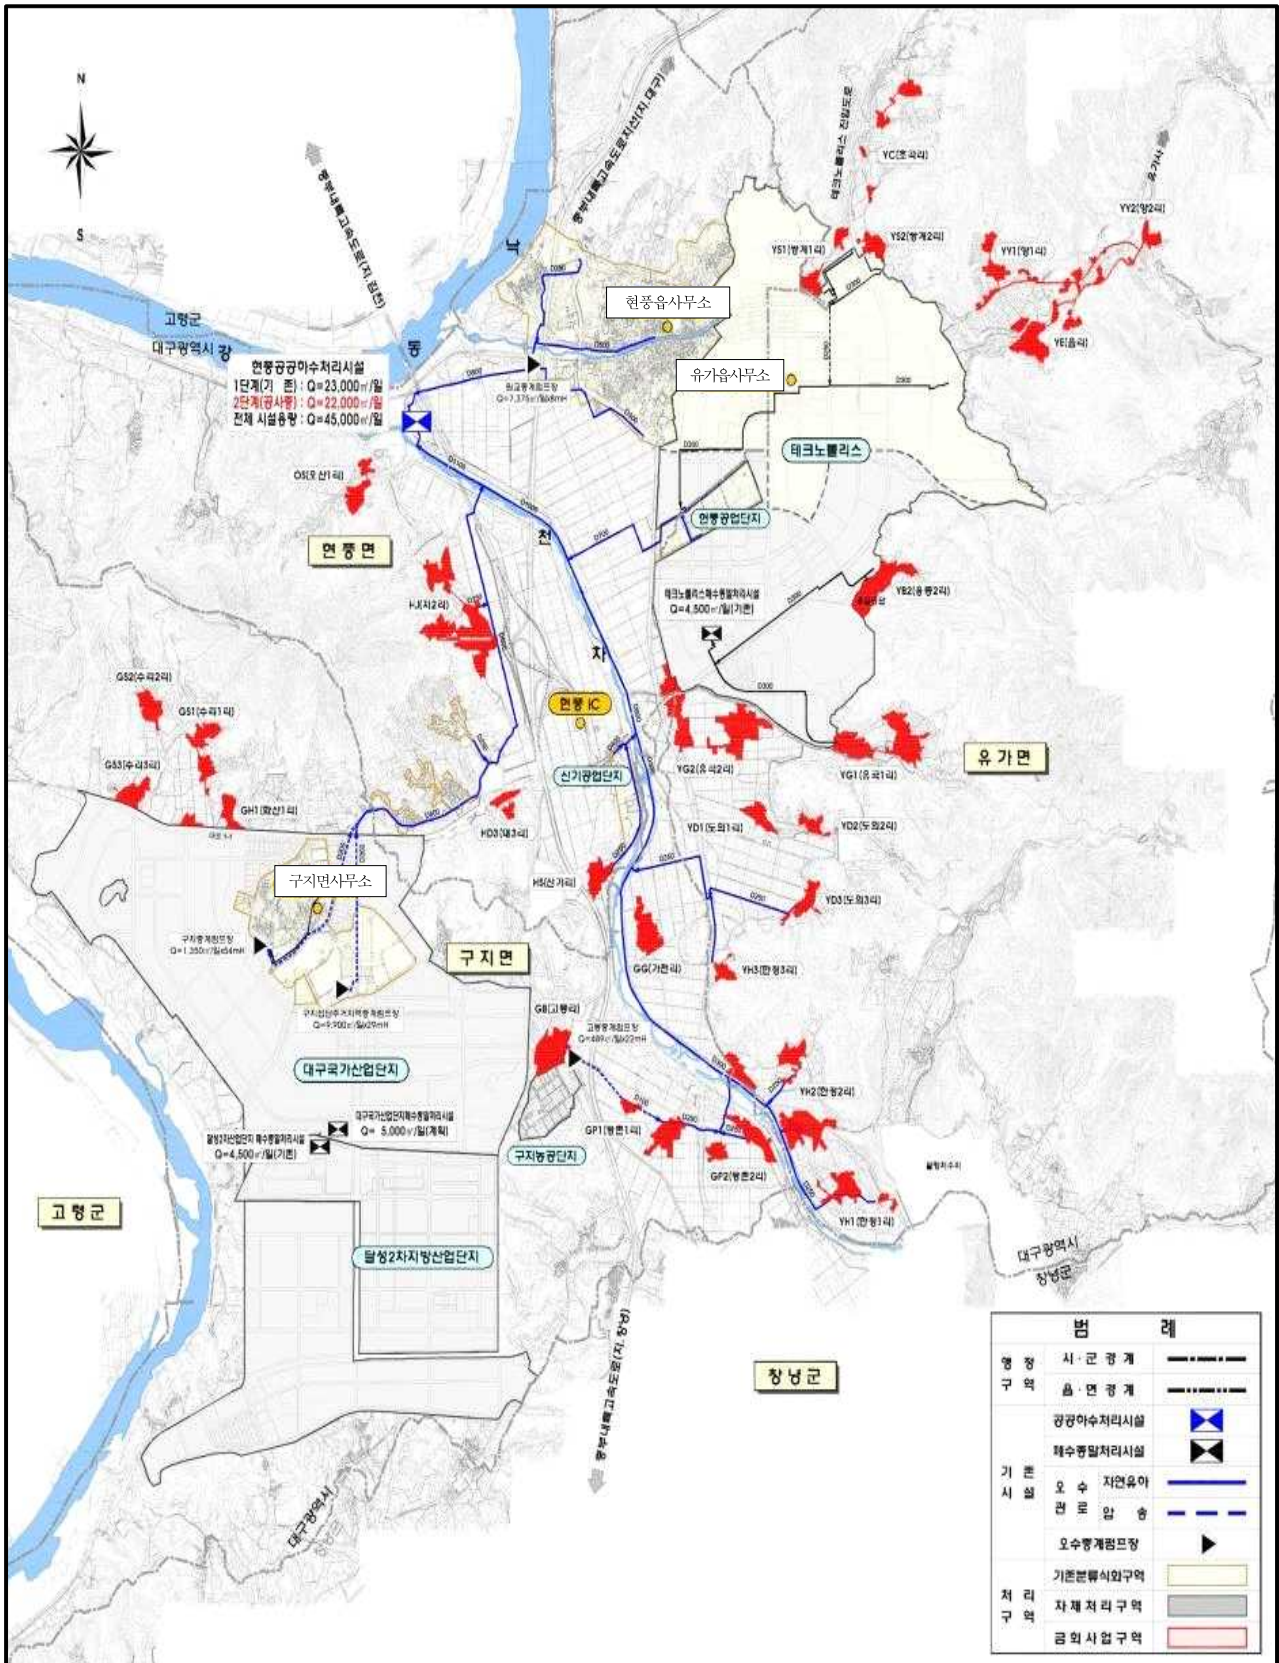

달성 테크노 스포츠센터 건립

주관부서 : 문화체육과 문화체육시설팀(☎2031)

사업목적

군민 누구나 일상생활 속에서 편리하게 이용할 수 있는 체육시설 확충을 통해 군민의 체력 및 건강 증진에 기여하고 스포츠클럽과 연계한 체육시설 운영으로 체육의 활성화에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 유가읍 상리 971번지
- 사업규모 : 지하 1층/지상 3층, 연면적 5,078.54㎡
※ 성인풀(25m*7레인), 어린이풀, 헬스장, 필라테스룸(G.X룸), 다목적 강당, 문화강좌실 등
- 사 업 비 : 214.7억 원(국비 30, 군 184.7)
- 사업기간 : 2017. 9. ~ 2023. 9.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2018년	2020년	2021년	2022년	2023년
계	21,470	3,540	1,700	5,500	5,000	5,730
국 비	3,000	-	1,700	1,300	-	-
군 비	18,470	3,540	-	4,200	5,000	5,730

□ 추진현황(공정률 : 13%)

- 2020. 8. : 건축설계공모 공고(조달청)
- 2020. 11. : 실시설계용역 착수
- 2021. 8. : 설계경제성(VE) 검토 심의
- 2021. 9. : 건설기술 심의
- 2022. 1. : 공용건축물 건축협약(대구경북경제자유구역청)
- 2022. 2. : 군 일상감사
- 2022. 4. : 시 계약심사
- 2022. 4. : 공사 착공
- 2022. 6. : 시 물품계약심사

□ 향후 추진계획

- 2023. 8. : 공사준공
- 2022. 9. : 건설사업관리용역 완료 및 시설 개방

■ 위치도



■ 조감도



달성군민운동장 리모델링 사업

주관부서 : 문화체육과 문화체육시설팀(☎2031)

사업목적

논공공업단지 근로자들이 퇴근 후 원활한 체육활동이 가능하도록 정비하여 이용률 제고 및 생활체육활성화에 기여하고, 지역주민들을 위한 산책로 및 휴게시설을 조성하여 체력증진 및 휴식공간 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 논공읍 논공로 697-10
- 사업규모 : 군민운동장 내 시설물 리모델링 1석
- 사 업 비 : 2,774백만원(국비 7.74억, 교부금 5억, 군비 15억)
- 사업기간 : 2020. 6. ~ 2022. 8.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2020년	2021년	2022년	향후계획
계	2,774	-	57	2,687	-
국 비	744	-	-	744	
교 부 금	500	-	-	500	
군 비	1,500	-	57	1,443	-

□ 추진현황(공정률 : 100%)

- 2020. 9. : 기본계획 및 타당성조사용역 완료
- 2021. 1. : 실시설계용역 착수
- 2021. 2. : 공모선정(공공체육시설 개보수 분야)
- 2021. 3. : 군 투자심사 완료
- 2021. 10. : 공공디자인 심의 완료
- 2021. 11. : 일상감사 등 행정절차 이행
- 2022. 1. : 공사 착공

□ 향후 추진계획

- 2022. 8. : 공사 준공

■ 위치도



■ 현장사진 (전후비교)



